

РАЗРАБОТАНО:  
ООО "Центр территориального  
развития"  
\_\_\_\_\_ Д. В. Миленин  
« 10 » июля 2023 г.



УТВЕРЖДЕНО:  
Мищенский территориальный отдел  
администрации Кочубеевского муниципального округа  
Ставропольского края  
\_\_\_\_\_ 2023 г.


РАССМОТРЕНО:  
ОГИБДД ОМВД России "Кочубеевский"  
\_\_\_\_\_ 2023 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ПЕШЕХОДОВ  
НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ  
МИЩЕНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА  
АДМИНИСТРАЦИИ КОЧУБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  
ХУТОР СТЕПНОЙ  
ТОМ 2  
ТОМОВ 3

Ставрополь 2023 г.

Откосы следа		
Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		
Продольный профиль		
Видимость в обратном направлении		

ПОДД Мищенского Территориального отдела  
ул. Набережная  
0+000-0+500

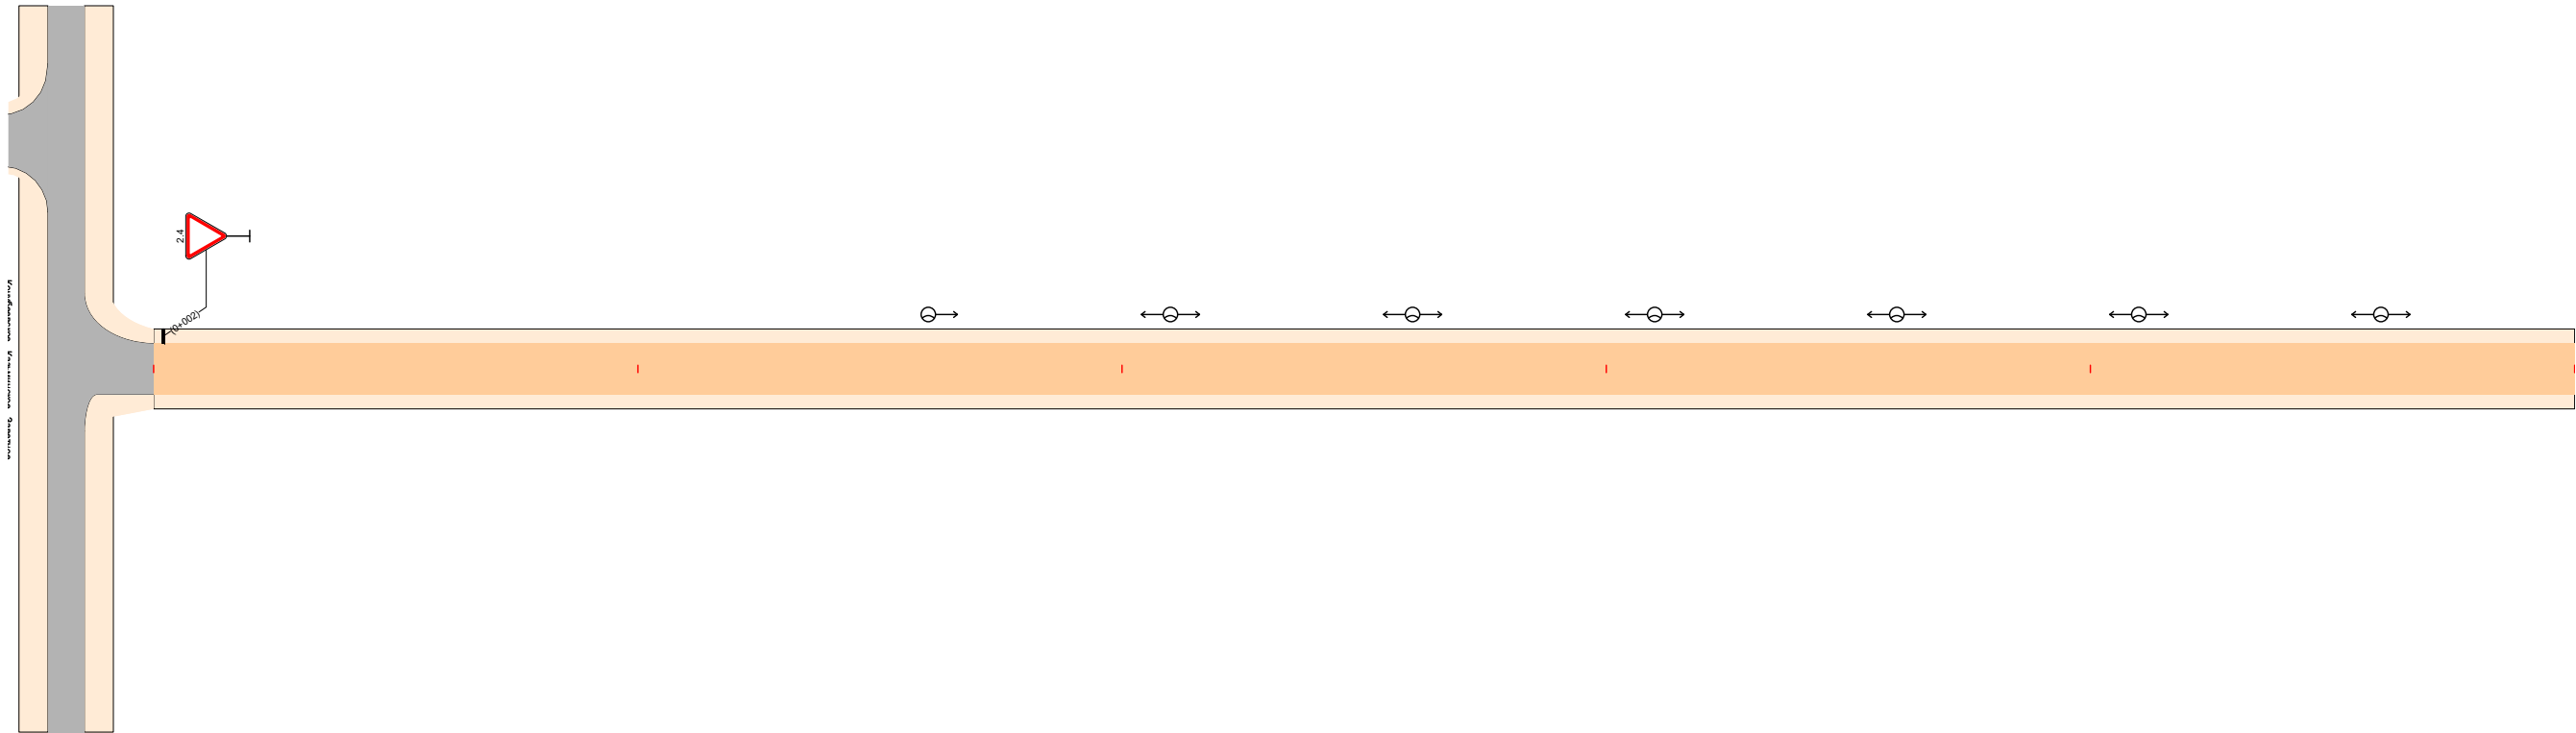

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		



# Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Набережная

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м <sup>2</sup> (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Состояние	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	-----------	------------	-------------------

## Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	I		0+002	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		1					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		1					

# Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Набережная

№п/п	Адрес, км+м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0+002	Слева	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,236
Итого							Установлено		1		
							Требуется		0		
							К демонтажу		0		
							Все		1		

## Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Набережная

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0+160	0+910		16/16	750	Установлено	Левая кромка

**Итоги по всем дорогам**

Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Установлено	16/16	750








Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		
Видимость в обратном направлении		

ПОДД Мищенского Территориального отдела  
ул. Пятигорская  
1+000-1+348



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

## Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Пятигорская

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0+189	1+036		18/18	847	Установлено	Левая бровка

**Итоги по всем дорогам**

Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Установлено	18/18	847
